

Задание 1

Последовательность работ проекта описывается сетевым графиком, изображённым на рис.1. Найти критический путь при условии, что длительности работ заданы одним из вариантов в табл.1.

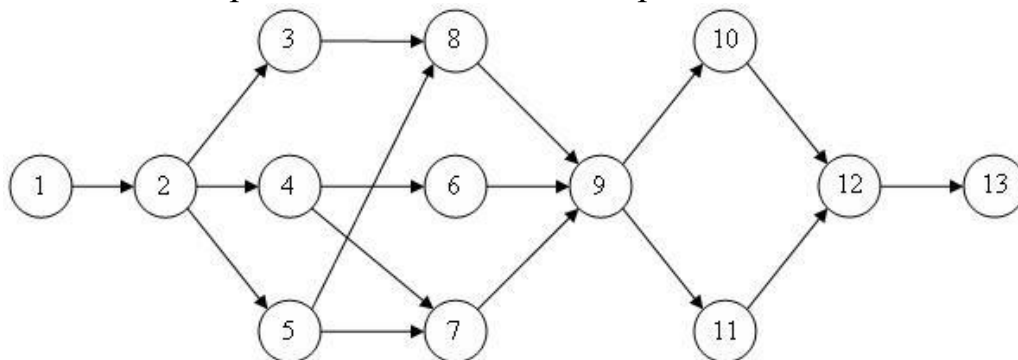


Рис.1. Сетевой график для задания 1 (по табл. 1)

Таблица 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	60	25	15	30	20	15	70	30	90	20	5	-
2	-	30	15	20	25	30	45	45	25	60	40	7	-
3	-	44	22	17	34	28	23	64	26	78	32	9	-
4	-	24	17	18	26	19	31	69	33	82	15	3	-
5	-	36	24	19	25	12	18	55	24	80	22	4	-
6	-	57	32	24	18	28	21	59	24	35	27	6	-
7	-	29	18	14	37	16	44	38	29	51	22	8	-
8	-	37	20	17	18	21	16	40	27	28	30	7	-
9	-	18	19	31	30	35	29	38	21	43	19	4	-
10	-	21	27	14	34	22	35	30	27	12	40	6	-
11	-	19	25	18	37	20	36	32	21	15	42	4	-
12	-	22	24	17	36	21	34	31	20	14	41	5	-
13	-	23	23	16	35	20	32	29	18	13	38	6	-
14	-	24	22	15	33	18	30	27	16	11	36	7	-
15	-	25	20	13	32	17	28	25	15	10	34	8	-

Последовательность работ проекта описывается сетевым графиком, изображённым на рис.2. Найти критический путь при условии, что длительности работ заданы одним из вариантов в табл.2.

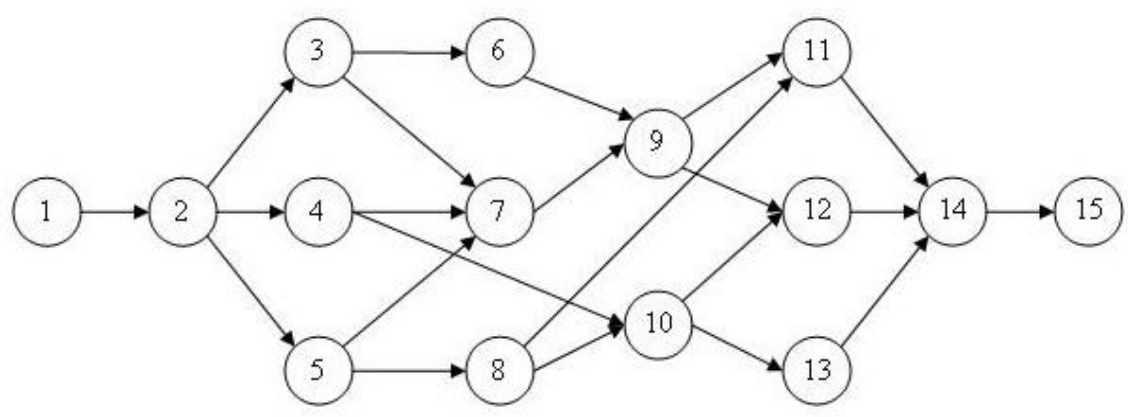


Рис.2. Сетевой график для задания 1 (по табл. 2)

Таблица 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	-	4	7	8	6	4	6	5	3	7	5	4	3	2	-
2	-	7	10	8	9	7	5	6	5	3	4	3	5	5	-
3	-	3	6	4	7	5	4	5	4	6	3	6	7	4	-
4	-	2	2	3	2	4	4	5	4	3	3	4	5	7	-
5	-	7	6	5	4	4	5	6	7	5	5	8	6	3	-
6	-	5	7	6	7	8	9	8	9	9	7	6	6	5	-
7	-	4	4	5	6	6	5	4	5	5	7	6	8	5	-
8	-	7	5	4	3	3	4	5	4	4	2	3	2	2	-
9	-	2	3	4	5	7	3	5	6	4	6	8	7	4	-
10	-	4	7	3	2	7	5	4	7	2	4	7	10	6	-
11	-	6	8	2	6	9	10	7	8	9	6	5	7	6	-
12	-	7	6	5	7	6	5	4	5	6	7	6	5	6	-
13	-	8	7	6	8	7	6	5	6	7	4	3	2	5	-
14	-	9	8	7	9	8	7	6	7	8	5	4	3	5	-
15	-	10	9	8	10	9	8	7	8	9	8	7	70	4	-
